

# Паспорт проекта «Оптимизация процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузка полученных результатов в систему АИС ГТО»

## Общая информация

Наименование органа власти: Шебекинский городской округ  
Наименование учреждения: МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа Белгородской области»  
Границы процесса: начало процесса – вход выпускником в личный кабинет системы АИС ГТО для представления учителю физической культуры УИН; окончание процесса – вход выпускником в личный кабинет системы АИС ГТО для проверки наличия своих протоколов с результатами выполнения нормативов ВФСК ГТО.  
Дата начала проекта: 01.08.2022 г.  
Дата окончания проекта: 25.12.2022 г.



## Обоснование выбора процесса

1. Жалобы родителей выпускников общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа об отсутствии результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО в личном кабинете ребенка. 15 жалоб по итогам I квартала 2022 года.
2. Более 200 выпускников 9х и 11х классов ежегодно выполняют нормативы ВФСК ГТО на базе своей школы, в результате низкой степени проработки протоколов с результатами выполнения нормативов ВФСК ГТО учителями школ, 20 % выпускников не получают свои результаты в личный кабинет системы АИС ГТО.

## Цели проекта

Сократить время процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО, формирование и загрузки полученных результатов в систему АИС ГТО на 44%

## Эффекты проекта

1. Достижение качественного выполнения определенного функционала в наиболее короткий срок.
2. Повышение уровня взаимодействия между всеми участниками процесса.
3. Сокращение временных затрат на 44 %

# Команда проекта

## Руководство проектом




### Заказчик проекта



Кочерова Анна Михайловна,  
заместитель главы администрации  
Шебекинского городского округа по  
социальной политике

### Руководитель проекта

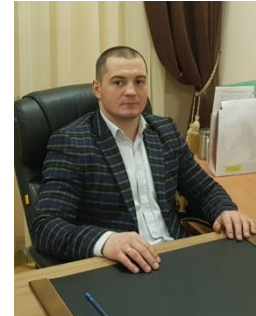

Белоусов Сергей Валерьевич,  
начальник МКУ «Управление физической  
культуры и спорта Шебекинского  
городского округа»

## Рабочая группа проекта




Бабенко Анна Николаевна,  
руководитель структурного  
подразделения ШМБУ «СК  
«Юность»



Мальцев Сергей Алексеевич,  
начальник отдела «УФКиС»  
Директор ШМБУ «СК «Юность»

# Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузка полученных результатов в систему АИС ГТО»

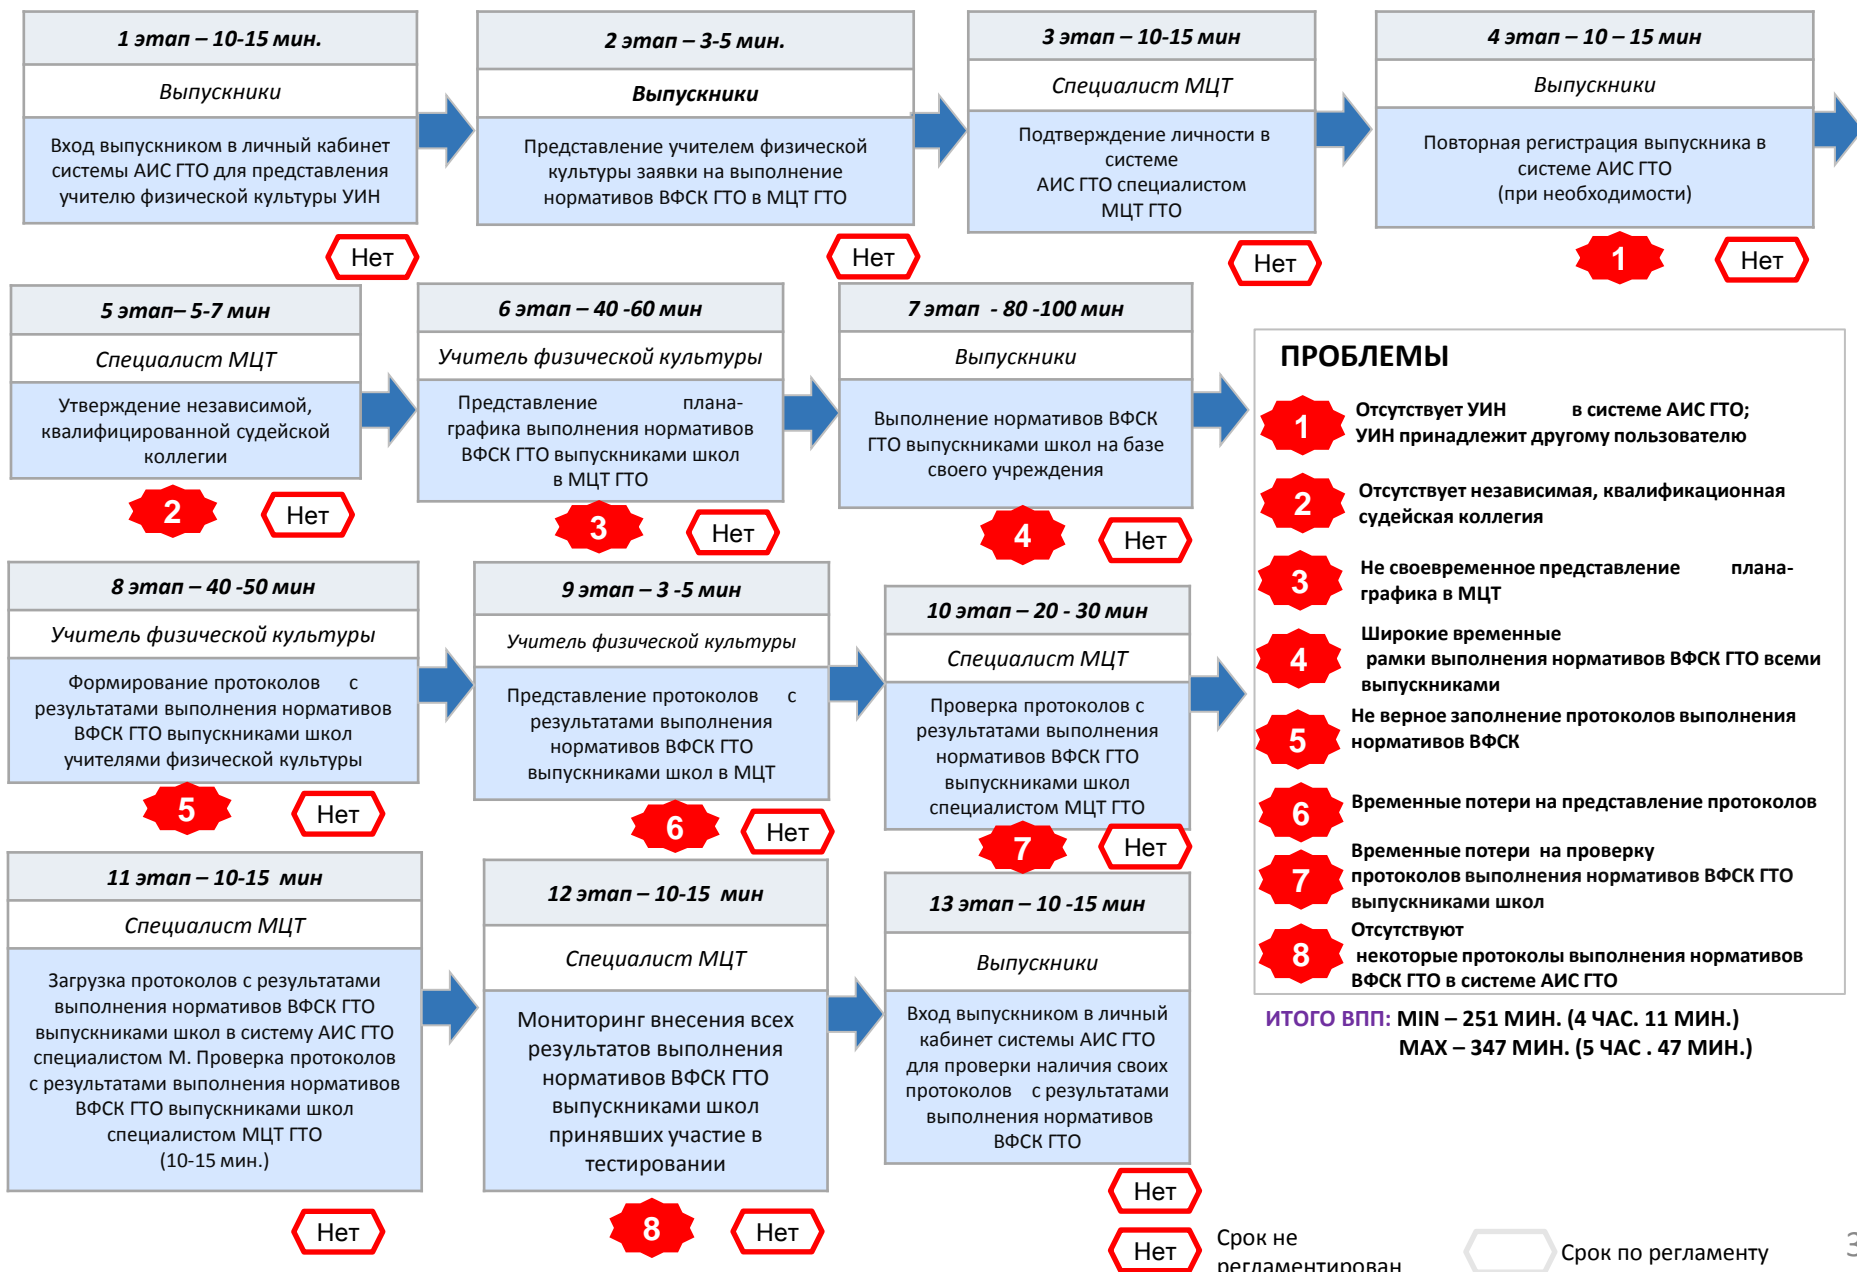


Пирамида проблем процесса «Оптимизации процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузка полученных результатов в систему АИС ГТО»



## Анализ проблем процесса «Оптимизации процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузка полученных результатов в систему АИС ГТО»

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижение цели
Отсутствие УИН в системе АИС ГТО (УИН принадлежит другому пользователю)	Недостаточная осведомленность	- разработка СОП для регистрации в системе АИС ГТО- разработка шаблона памятки «Пути регистрации в системе АИС ГТО»	Экономия времени процесса 10 мин.
Отсутствие независимой квалифицированной судейской коллегии в школах округа	Нехватка квалифицированных кадров в школах	- обучение судей  - работа независимой, квалифицированной, муниципальной судейской коллегии в МЦТ ГТТО	Экономия времени процесса 5 мин.
Не своевременное представление графиков выполнения нормативов ВФСК ГТО в МЦТ	Технические проблемы с интернет ресурсами	- формирование МЦТ единого графика выполнения нормативов ВФСК ГТО для всех выпускников городских общеобразовательных организаций  - формирование МЦТ единого графика выполнения нормативов ВФСК ГТО для всех выпускников сельских общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа	Экономия времени процесса 20 мин.
Широкие временные рамки выполнения нормативов всеми выпускниками на базе своего учреждения	Загруженность учителей физической культуры во внеурочное время	- организация и проведение единых дней выполнения нормативов ВФСК ГТО на базе спортивного комплекса «Юность», для выпускников городских общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа  - организация и проведение единых дней выполнения нормативов ВФСК ГТО на базе спортивного комплекса «Юность», для выпускников городских общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа	Экономия времени процесса 20 мин.
Не верное заполнение протоколов выполнения нормативов ВФСК ГТО учителями школ	Низкая степень проработки	- подготовка образцов протоколов на всех выпускников образовательных организаций Шебекинского городского округа  - внесение результатов в протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО специалистом МЦТ	Экономия времени процесса 20 мин.

# Карта целевого состояния процесса «Оптимизации процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузка полученных результатов в систему АИС ГТО»

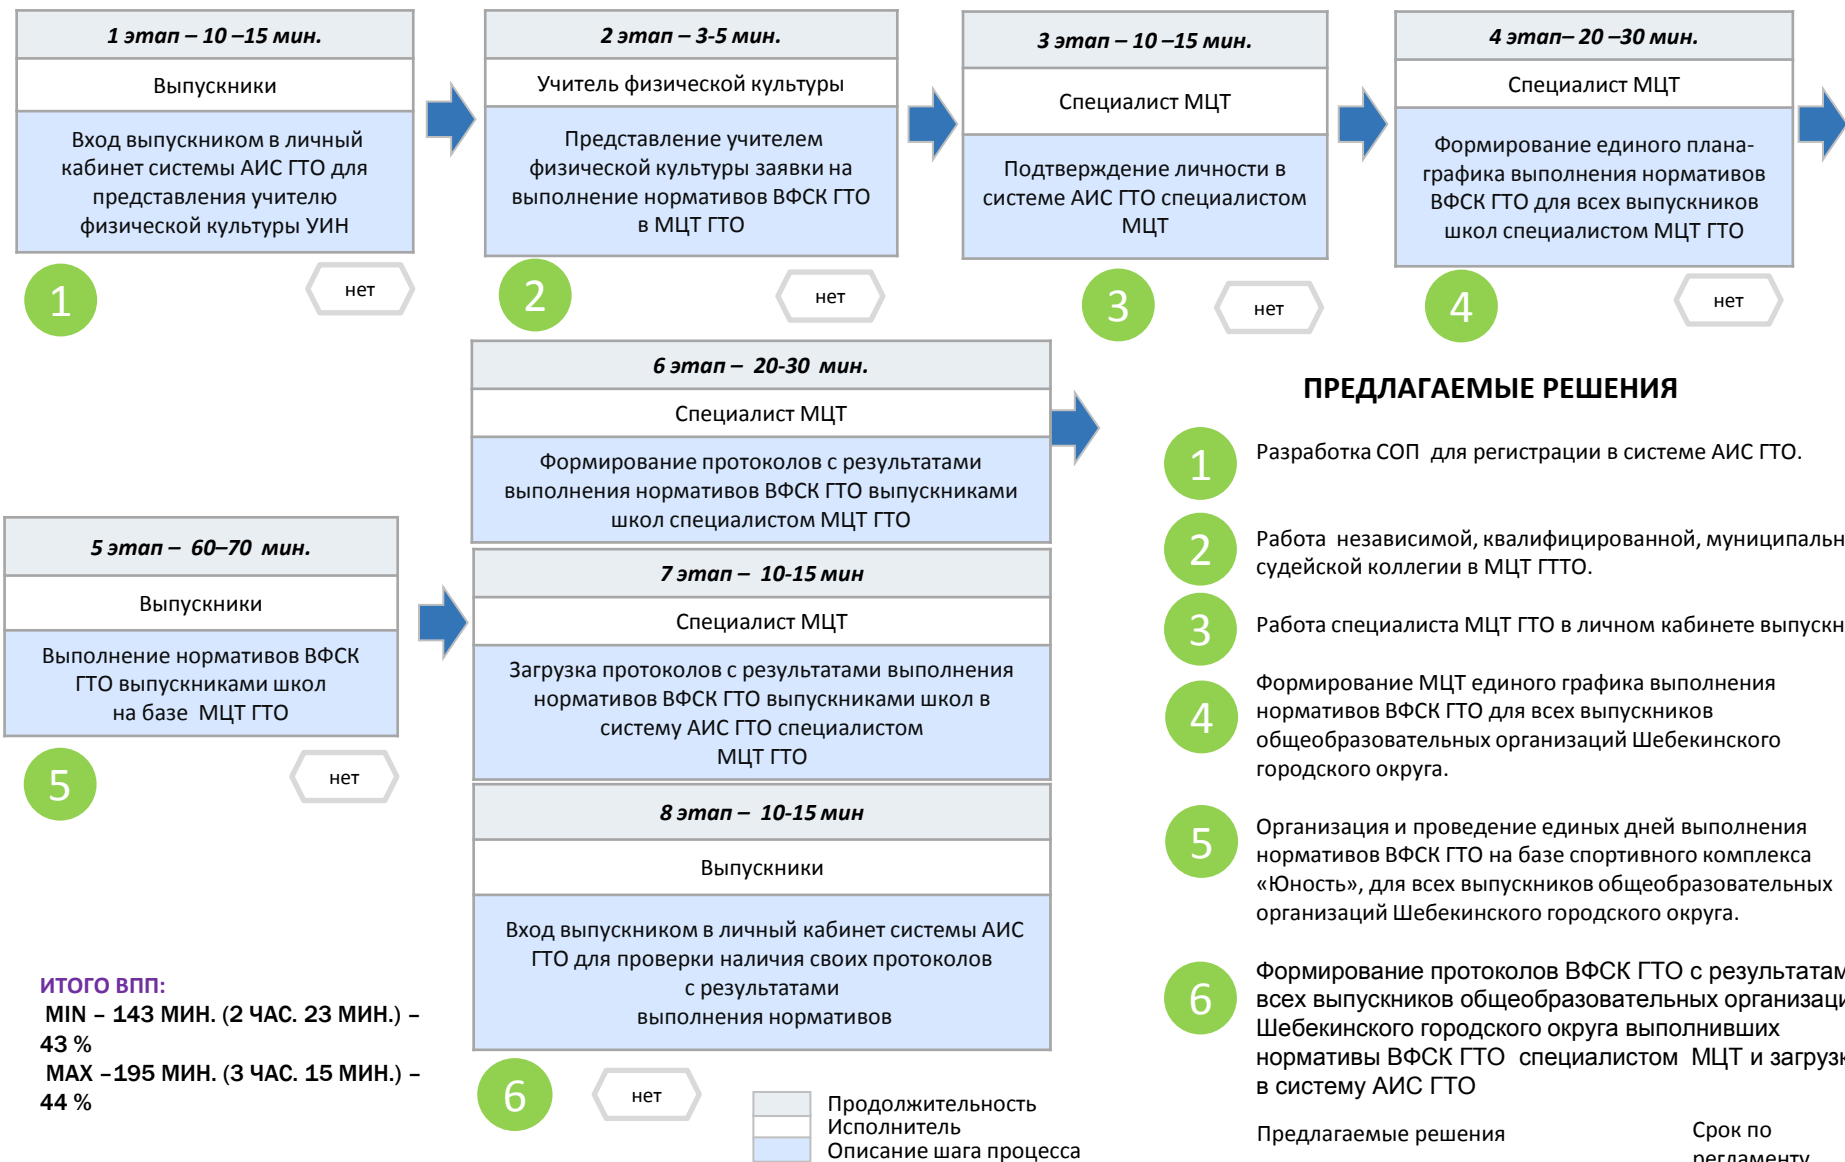

# Достигнутые результаты (было и стало)

## БЫЛО

Отсутствие УИН  
в системе АИС  
ГТО (УИН  
принадлежит  
другому  
пользователю)

## СТАЛО

Решение №1. Разработка  
СОП для регистрации в  
системе АИС ГТО

Решение №2. Разработка  
шаблона памятки «Пути  
регистрации в системе АИС  
ГТО»

Чек - лист		
№ п/п	Наименование позиции	Отметка о выполнении
1.	Перейти на страницу <a href="http://aish.gto.ru/registration">http://aish.gto.ru/registration</a>	<input type="checkbox"/>
2.	Войти на вальсую «Регистрация»	<input type="checkbox"/>
3.	Предоставить достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы	<input type="checkbox"/>
4.	Заполнить данные ответственного лица с актуальным номером телефона	<input type="checkbox"/>
5.	Загрузить фото	<input type="checkbox"/>
6.	Во входе «Активность» отметить пункты деятельности.	<input type="checkbox"/>
7.	Поставить галочку напротив поля «Я согласен с обработкой персональных данных»	<input type="checkbox"/>
8.	Получить свой уникальный идентификационный номер (УИН) в формате 22-31-0000000	<input type="checkbox"/>
9.	Направить свой УИН ответственному лицу на ГТО в образовательном учреждении	<input type="checkbox"/>
10.	Получить график выполнения нормативов ФИСК ГТО	<input type="checkbox"/>
11.	Выполнить нормативы комплекса ГТО	<input type="checkbox"/>
12.	Проверить в своем личном кабинете, загружены ли достоверные нормативы в красном цвете отгрузки	<input type="checkbox"/>





# Достигнутые результаты (было и стало)


## БЫЛО

Отсутствие  
независимой  
квалифицирова  
нной судейской  
коллегии в  
школах округа

## СТАЛО

Решение №3.  
Обучение судей  
онлайн

Решение №4.  
Работа независимой,  
квалифицированной,  
муниципальной  
судейской коллегии в  
МЦТ ГТО

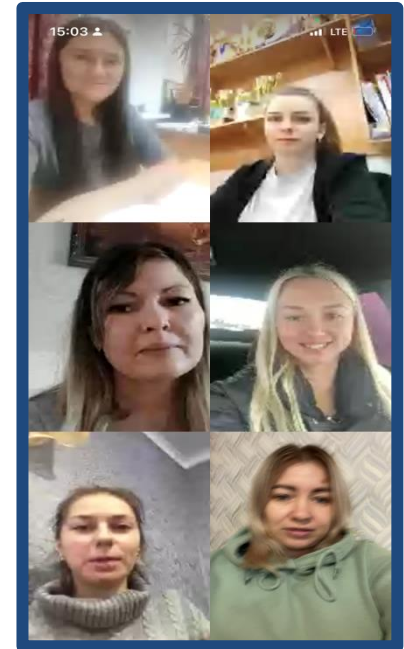



# Достигнутые результаты (было и стало)

## БЫЛО

Не своевременное  
представление  
графиков  
выполнения  
нормативов  
ВФСК ГТО  
в МЦТ

## СТАЛО

### Решение №5.

формирование МЦТ единого  
графика выполнения  
нормативов ВФСК ГТО для  
всех выпускников городских  
общеобразовательных  
организаций

### Решение №6.

формирование МЦТ единого  
графика выполнения  
нормативов ВФСК ГТО для  
всех выпускников сельских  
общеобразовательных  
организаций Шебекинского  
городского округа

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
«Центр тестирования ГТО»  
ШМБУ «СК «Юность»  
А.И. Бабенко  
2022 г.

График выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов городских общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа

20 октября 9-е классы  
Стадион «Юность» 14.00 часов

1	Школа № 1
2	Школа № 2
3	Школа № 3
4	Школа № 4
5	Школа № 5
6	Школа № 6

21 октября 11-е классы  
Стадион «Юность» 14.00 часов

1	Школа № 1
2	Школа № 2
3	Школа № 3
4	Школа № 4
5	Школа № 5
6	Школа № 6

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
«Центр тестирования ГТО»  
ШМБУ «СК «Юность»  
А.И. Бабенко  
2022 г.

График выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов сельских общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа

27 октября 9-11е классы  
Стадион «Юность» 14.00 часов

1	Беловодская школа
2	Беловская школа
3	Белаягородская школа
4	Белыйгородская школа
5	Белосельская школа
6	Грифовская школа
7	Кутинская школа
8	Масловская школа
9	Мельниковская школа
10	Масловористовская школа
11	Муромская школа
12	Новотаволжская школа
13	Новоская школа
14	Первомайская школа
15	Рассветная школа

# Достигнутые результаты (было и стало)

## БЫЛО

Широкие  
временные рамки  
выполнения  
нормативов всеми  
выпускниками на  
базе своего  
учреждения

## СТАЛО

### Решение №7.

Организация и проведение  
единых дней выполнения  
нормативов ВФСК ГТО на базе  
спортивного комплекса  
«Юность», для выпускников  
городских  
общеобразовательных  
организаций Шебекинского  
городского округа

### Решение №8.

Организация и проведение  
единых дней выполнения  
нормативов ВФСК ГТО на  
базе спортивного комплекса  
«Юность», для выпускников  
городских  
общеобразовательных  
организаций Шебекинского  
городского округа



# Достигнутые результаты (было и стало)

## БЫЛО

Не  
предоставлены  
некоторые  
протоколы  
выполнения  
нормативов  
ВФСК ГТО  
в МЦТ

## СТАЛО

### Решение №9.


Протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа загружены в систему АИС ГТО, выпускникам присвоены знаки отличия комплекса ГТО



# Производственный анализ

Производственный анализ процесса выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа и загрузки полученных результатов в систему АИС ГТО

Дата	Наименование организации	Время протекания процесса		Расхождение Мин (+/-)	Причина расхождения
		План, мин	Факт, мин		
1. 10. 2022 г. - 2. 10. 2022 г.	Вход выпускником в личный кабинет системы АИС ГТО для представления учителю физической культуры УИИ	10 - 15	15	0	
1. 10. 2022 г.- 15. 10. 2022 г.	Представление учителем физической культуры заявки на выполнение нормативов ВФСК ГТО в МЦТ ГТО	3 - 5	5	0	
1. 10. 2022 г.- 17. 10. 2022 г.	Подтверждение личности в системе АИС ГТО специалистом МЦТ	10 - 15	15	0	
1. 10. 2022 г.- 25. 10. 2022 г.	Формирование единого плана графика выполнения нормативов ВФСК ГТО для всех выпускников школ специалистом МЦТ ГТО	20 - 30	40	+ 10	Не все учителя физической культуры корректно заполнили график
1. 11. 2022 г.- 25. 11. 2022 г.	Выполнение нормативов ВФСК ГТО выпускниками школ на базе МЦТ ГТО	60 - 70	70	0	
25. 11. 2022 г.-	Формирование протоколов с	20 - 30	30	0	

30. 11. 2022 г.	результатами выполнения нормативов ВФСК ГТО выпускниками школ специалистом МЦТ ГТО				
1.12.2022 г – 28.12.2022 г	Загрузка протоколов с результатами выполнения нормативов ВФСК ГТО в систему АИС ГТО специалистом МЦТ ГТО	15 - 20	10	-5	Загрузка Протоколов осуществляли все сотрудники МЦТ
25.12.2022 г. - 28.12.2022 г.	Вход выпускниками в личный кабинет системы АИС ГТО для проверки наличия своих протоколов с результатами выполнения нормативов ВФСК ГТО	15 - 20	10	-5	Благодаря разработанным СО
Итого время протекания процесса:				195 минут	
<p>Начальник МКУ «УФКиС», член рабочей группы</p> <p style="text-align: right;"> С. В. Белоусов</p>					

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ



Удовлетворенность итогами  
реализации  
проекта составила  
**100 %**

# Достигнутые результаты (было и стало)

**БЫЛО**

ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ  
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ  
ВФСК ГТО ВЫПУСКНИКАМИ  
9-Х И 11-Х КЛАССОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  
ШЕБЕКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И  
ЗАГРУЗКИ ПОЛУЧЕННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМУ  
АИС ГТО



251 - 347 мин.

**СТАЛО**

СОКРАЩЕНО  
ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА  
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВФСК  
ГТО ВЫПУСКНИКАМИ 9-Х И 11-Х  
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ШЕБЕКИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЗАГРУЗКИ  
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В  
СИСТЕМУ АИС ГТО



195 мин.
